

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CAPTURA DEL 3er TRIMESTRE 2023 DEL SRFT.
OFICIO NÚM.: H.A.TEN. / D.O.P. / 318/2023
TENANCINGO, TLAXCALA. A 13 DE OCTUBRE DE 2023

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE.



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISM EJERCICIO 2023 que se registraron en los **Módulos de EJERCICIO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO E INDICADORES al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, los anexos A, B Y C.



Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TENANCINGO, TLAXCALA, A 13 DE OCTUBRE DE 2023
C.D. MICAELA GUZMÁN GUZMÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENANCINGO, TLAXCALA.

C.c.p.- Arq. Abel Francisco Gutiérrez Andrade.- Director de Obras Publicas Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	TENANINGO

Trimestre a reportar: 3 ER trimestre de 2023

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Partidas			Avance Financiero				Observaciones																				
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Gastos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluido)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																
																Mantencimiento Financiero	90.00	90.00	611	612	613	614	615	622	515	325					
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	611	659,601.24	659,601.24	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS REALIZADAS AL SIN COLOCACION DE CALENTADOR SOLARES EN CASA HABITADORI										
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	612	177,755.57	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	152,623.19	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVI ESCUELA									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	613	3,220,000.00	3,220,000.00	3,000,000.00	1,724,675.84	1,368,085.08	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	1,368,085.58	OBRAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFUNDO DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TIRIQUE P ALUMBRAMIENTO DE AGUA POT									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	614	2,260,000.10	2,840,612.20	2,840,612.20	2,840,512.20	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	2,091,867.08	OBRAS REFERENTES A LA CONTRUCCION DE GUARNICION BANQUETAS, RED DEAGUA POT ALCANTARILLADO SANITARIO, ELECTRIFICACION Y REHABILIT/ ALUMBRADO PUBLICO									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	615	5,301,617.47	4,748,641.76	3,534,055.99	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	342,255.09	OBRAS PARA LA CONSTRUCCO CALLES CON CONCRETO HIBRI Y ADOSCRETO									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	622	2,507,940.59	2,907,690.38	2,607,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS REFERENTES A LA REHABILITACION DEL DIF MUNIK POLIDEPORTIVO									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	2	515	159,669.23	159,669.23	159,669.23	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	67,158.60	ADQUISICION DE COMPUTADOR MULTIFUNCIONAL									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	1	325	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA SUPERVI									
AREAS A REQUISITAR												14,777,843.00	14,777,843.00	13,255,056.00	5,127,748.09	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	3,992,252.71	MUNICIPIO DE TENANINGO, TLAX

C.D. MARCELA GONZALEZ GUZMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENANINGO, TLAXCALA
(Nombre y firma)
Atestado

MUNICIPIO DE TENANINGO, TLAX
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENANINGO, TLAX
TESORERIA MUNICIPAL

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Trimestre a reportar:

3.er Trimestre de 2023

Entidad Federativa:




TLAXCALA

Municipio:

TEWANANINGO

FOLIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
		Clave de Pro	Programa Fideicomiso	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
TLA23030222836	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 29KJ02870 PLAZA CIVICA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	152,828.19	152,828.19	152,828.19	152,828.19	152,828.19	152,828.19	152,828.19	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030222833	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATRO NORTE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	112,991.35	112,991.35	112,991.35	112,991.35	112,991.35	112,991.35	112,991.35	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030224690	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CATORCE ORIENTE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	72,825.90	72,825.90	72,825.90	72,825.90	72,825.90	72,825.90	72,825.90	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030224797	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DOCE ORIENTE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	150,956.91	150,956.91	150,956.91	150,956.91	150,956.91	150,956.91	150,956.91	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030224807	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO. (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	395,469.70	395,469.70	395,469.70	395,469.70	395,469.70	395,469.70	395,469.70	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030224818	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSADO EN CALLE CUATRO NORTE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	342,255.06	342,255.06	342,255.06	342,255.06	342,255.06	342,255.06	342,255.06	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030225744	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TERCERA PRIVADA DE LA AVENIDA REFORMA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE DA AVANCE 0.00 EN FISICO Y FINANCIERO. SE ATENDERAN OBSERVACIONES EN LA MDS
TLA23030226643	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVE SUR	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	105,269.63	105,269.63	105,269.63	105,269.63	105,269.63	105,269.63	105,269.63	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030226649	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL PRIVADA A	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	41,764.55	41,764.55	41,764.55	41,764.55	41,764.55	41,764.55	41,764.55	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030226644	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL PRIVADA B	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	57,774.99	57,774.99	57,774.99	57,774.99	57,774.99	57,774.99	57,774.99	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030226765	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE CAMINO REAL	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	73,268.14	73,268.14	73,268.14	73,268.14	73,268.14	73,268.14	73,268.14	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030226747	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE RED DE ENERGIA EN CALLE CUARTA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	62,992.12	62,992.12	62,992.12	62,992.12	62,992.12	62,992.12	62,992.12	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TLA23030226826	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO TRES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80.00	79.31%	1,724,976.84	1,724,976.84	1,724,976.84	1,724,976.84	1,368,035.58	1,268,065.58	1,268,065.58	OBRA PROCESO
TLA23030226810	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	75.00	62.75%	1,764,189.91	1,764,189.91	1,764,189.91	1,764,189.91	1,107,081.56	1,107,081.56	1,107,081.56	OBRA PROCESO
TLA23030226480	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	67,198.80	67,198.80	67,198.80	67,198.80	67,198.80	67,198.80	67,198.80	ACCION TERMINADA
TLA23030226981	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (MULTIFUNCIONAL)	34	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						5,127,769.99	5,127,769.99	5,127,769.99	5,127,769.99	3,632,233.71	3,632,233.71	3,632,233.71	

000582

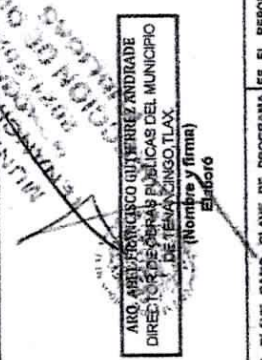

PARA EL CARGO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, MODULO DESTINO DEL GASTO, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE TENANCINGO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50%	1	2	#DIV/0!	0	0	A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA MIDS, POR LO TANTO NO SE MIGRARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	45%	5	11	0%	0	2	A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MIDS, POR LO TANTO NO SE MIGRARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	39%	7	18	12.5%	2	16	A LA FECHA SE HAN REGISTRADO 2 PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIOS EN EL TERCER TRIMESTRE EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	45%	10	22	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE TENANCINGO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50%	1	2	#DIV/0!	0	0	A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA MIDS, POR LO TANTO NO SE MIGRARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	38%	4	11	100%	2	2	A LA FECHA SE HAN REGISTRADO 2 PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MIDS
	3er. Trimestre	44%	8	18	75%	12	16	A LA FECHA SE HAN REGISTRADO 12 PROYECTOS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA EN EL TERCER TRIMESTRE EN LA MIDS
	4to. Trimestre	41%	9	22	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE TENANCINGO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	2	#DIV/0!	0	0	A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN OTROS PROYECTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA MIDS, POR LO TANTO NO SE MIGRARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	18%	2	11	0%	0	2	A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS EN OTROS PROYECTOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MIDS, POR LO TANTO NO SE MIGRARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	17%	3	18	12.5%	2	16	A LA FECHA SE HAN REGISTRADO 2 PROYECTOS EN OTROS PROYECTOS EN EL TERCER TRIMESTRE EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	14%	3	22	#DIV/0!			

* Numerador y Denominador (# Número proyectos) son los Caminos a registrar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las variables.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 1er trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
 INDICADOR: 5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 100%

ARQ. ABEL FRANCISCO GUTIERREZ ANDRADE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX.
 (Nombre y firma)

C.D. RICARDO GUZMAN
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENANCINGO, TLAXCALA.
 (Nombre y firma)

Mostrar programas

TOTAL REGS ENTIDAD/MUNICIPIO CICLO RECURSO PERIODO RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO TRANSFERIDC

1 Tenancingo 2023 3 Tercer Trimestre 33 Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal \$1,255,056.00

ESTATUS ENTIDAD/MUNICIPIO CICLO RECURSO PERIODO RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO


Revisión Tenancingo 2023 3 Tercer Trimestre 33 Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

1 Tenancingo 2023 3 Tercer Trimestre 33 Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios 1005 FORTAMUN \$8,651,724.00

ESTATUS ENTIDAD/MUNICIPIO CICLO RECURSO PERIODO RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Revisión Tenancingo 2023 3 Tercer Trimestre 33 Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios 1005 FORTAMUN

Mostrando 1 al 2 de 2 programas



000584
